

Keuzelijst meer- en minderwerk

Projectnummer: 21366

Projectomschrijving: 11 woningen plan 'Landje van Sinneveld' te Santpoort-Zuid

Woningtype: Halfvrijstaande villa – bouwnummer 1 t/m 4

03-06-2023



Bwnr Naam

Adres

PC + Woonplaats

Telefoon (privé) (zaak) (mobiel)

E-mail

1. Algemeen

Het kopen van een nieuwe woning is een belangrijke beslissing. Bij het nemen van een dergelijke beslissing spelen individuele wensen en voorkeuren een belangrijke rol. Om tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen bieden wij u, door middel van deze keuzelijst en uw individuele wensen, de mogelijkheid om wijzigingen ten opzichte van de standaard uitvoering te laten realiseren.

Het uitgangspunt voor het meer- en minderwerk en de individuele wensen zijn de verkooptekeningen, de technische omschrijving, algemene verkoopinformatie, de koop-/aanneemovereenkomst en de bij deze keuzelijst behorende bijlage met optietekeningen.

De omschreven/weergegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten door de koper aan derden (bijvoorbeeld t.b.v. de keukeninrichting of te plaatsen zonwering). Geadviseerd wordt om na oplevering de betreffende onderdelen fysiek in te meten.

2. Kopers meer- en minderwerk

Binnen de opzet van het bouwplan wordt de kopers een keuzelijst meer- en minderwerk aangeboden met hierin diverse ruw- en afbouwmogelijkheden. Tevens zijn individuele wensen bespreekbaar. Met plezier kan de kopersbegeleider u hierover verder informeren.

Verder biedt Kuin de mogelijkheid aan om bij vooraf geselecteerde showrooms opties te kiezen t.b.v. de badkamer, elektra en afbouw van uw woning.

Voor de procedure "Invullen keuzelijst meer- en minderwerk" verwijzen wij naar punt 3. Voor de procedure "Bezoek showrooms" verwijzen wij naar punt 5. Individuele vragen en wensen kunt u Kuin via het kopersportaal toezenden. Toegang voor het kopersportaal ontvangt u binnen enkele dagen nadat Kuin een ondertekende aannemingsovereenkomst in bezit heeft.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat indien u na oplevering zelf de woning verder wenst af te bouwen (bijv. de badkamer), diverse zaken vergunning-/ of meldingsplichtig kunnen zijn bij de gemeente waarin uw woning wordt gebouwd. U zult hier zelf zorg voor moeten dragen.

3. Procedure invullen "keuzelijst meer- en minderwerk"

U kunt uw keuzes uit de "keuzelijst meer- en minderwerk" kenbaar maken door ze aan te vinken in het kopersportaal.

Let op: bij het aanvinken van de optie dient u goed te controleren of de door u gewenste optie mogelijk is in combinatie met andere door u gekozen opties.

Wij zullen samen met u de ruwbouwopties van de "keuzelijst meer- en minderwerk" volledig invullen tijdens het 1^e kopersgesprek. Naderhand dient u zelf de opties te bevestigen in het kopersportaal.

Het meer- en minderwerk kunt u opgeven tot dat de sluitingsdatum is verstreken. Om te voorkomen dat de voortgang van de bouw wordt verstoord, kunnen meer- en minderwerkzaamheden na de sluitingsdatum, hoe gering van aard en omvang deze ook lijken te zijn, uitsluitend na overleg in opdracht worden genomen.

Het is mogelijk dat meer- en minderwerk opgaves na de sluitingsdatum prijsconsequenties kunnen hebben of worden afgewezen. Het is dus van belang dat u tijdig uw keuzes bepaalt en rekening houdt met de sluitingsdatums.

Indien u niet tijdig een keuze kunt maken, niet reageert of niet naar één van de door Kuin geselecteerde showrooms wenst te gaan, dan wordt de woning standaard opgeleverd volgens de koop-/aanneemovereenkomst.

4. Energie Prestatie

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwbouw woningen, uw woning wordt hieraan getoetst d.m.v. een BENG berekening. Diverse kopersopties uit afdeling 1 Ruwbouw kunnen invloed hebben op deze berekening. Na de sluitingsdatum van afdeling 1 Ruwbouw wordt er een herberekening van de woning gemaakt. Indien deze herberekening de eisen gesteld in het bouwbesluit overschrijdt behoudt de aannemer zich het recht om opties te mogen laten vervallen/annuleren.

5. Procedure “Bezoeken showrooms”

U wordt benaderd voor een afspraak om de showrooms te bezoeken welke voor dit werk speciaal zijn geselecteerd.

Mocht u een showroom bezoeken zonder afspraak, dan kan het zo zijn dat de verkopers die specifiek van uw project op de hoogte zijn, andere afspraken hebben of op dat moment niet aanwezig zijn. En juist deze adviseurs in de showroom kunnen uw vragen over uw woning beantwoorden.

Indien u geen afspraak wenst met (een van) de showrooms, dan kunt u dit kenbaar maken bij de kopersbegeleiding van Kuin.

Soms kunnen showroomprijzen direct worden afgegeven, mogelijk zal de adviseur u een prijsaanbieding later doen toekomen. Bij de showroomoffertes zullen de meerprijzen zichtbaar in de aanbieding worden vermeld. Op deze wijze ontvangt u een overzicht van het bedrag dat u moet bijbetalen.

Ook is het mogelijk dat een offerte wordt uitgebracht in twee stappen (op de offertes wordt dit dan vermeld). Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer bij de door u gewenste uitvoering, de installateurs extra werkzaamheden moeten verrichten óf wanneer aanvullende bouwkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Betreffende uw tegelkeuze is het raadzaam om eerst uw ontwerp van het sanitair af te ronden en pas daarna aan de hand van uw badkamerontwerp het tegelwerk te kiezen.

Zodra u een overzicht heeft van de (prijs)consequentie, maakt u uw definitieve keuze bekend. Door middel van uw goedkeuring van de uitgebrachte offertes geeft u opdracht aan de aannemer.

Niet alle showrooms hebben de mogelijkheid om kopers op een zaterdag te ontvangen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij verzoeken u om bij een bezoek aan de showrooms aan te geven dat u komt voor een specifiek project. Vermeld uw bouwnummer, woningtype en eventueel al gekozen meer- en minderwerk. Dit voorkomt misverstanden.

6. Sluitingsdatum meer- en minderwerk

Alle (individuele) meer- en minderwerk opties dienen uiterlijk voor de opgegeven sluitingsdatums bevestigd te zijn.

Indien u niet tot overeenstemming kunt komen met een van de door de aannemer aangewezen showrooms, dan is de consequentie dat het desbetreffende onderdeel standaard of casco wordt opgeleverd.

Ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden betreffende uw keuze is het van belang dat u bereikbaar bent, zodat alle keuzes voor de sluitingsdatum bij de aannemer definitief bekend zijn.

7. Betaling

Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk gelden de voorwaarden en de termijnregeling conform de koop-/aannemingsovereenkomst. De termijnbetaling is als volgt:

- Eerste termijn 25% van het totaalbedrag bij opdracht, van zowel het meer- als het minderwerk.
- Tweede en laatste termijn 75% bij gereedkomen van het meer- en minderwerk.

Alle meer- en minderwerkprijzen genoemd in de “keuzelijst meer- en minderwerk” zijn vermeld in euro's inclusief 21% BTW. Eventuele wijzigingen in het Btw-tarief worden conform de wettelijke voorschriften doorgevoerd.

8. Tenslotte

Bij woningen welke worden verkocht na aanvang van de bouw of na de sluitingsdatum meer- en minderwerk, behouden wij ons het recht voor het meer- en minderwerk, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. Hierbij kan het voorkomen dat tijdens de bouw besloten is om onverkochte woningen van meerwerk te voorzien, welke u dan verplicht bent om af te nemen.

Werkzaamheden door de koper of derden tijdens de bouw kunnen wij wegens veiligheid, organisatie en verantwoordelijkheden niet toestaan.

Naast bezoek aan de showrooms, bestaat de “keuzelijst meer- en minderwerk” uit een aantal vaste keuze omschrijvingen met bijbehorende prijzen. Er vindt geen aanvullende verrekening plaats indien gekozen wordt voor (meerdere) combinaties van keuze opties.

Omdat de ervaring leert dat het voor u als koper soms niet altijd even inzichtelijk is waarom er voor minderwerk bijbetaald moet worden, willen wij vermelden dat er bij minderwerk extra kosten ontstaan door eventuele extra werkzaamheden en verstoring in het productieproces, organisatie en administratie.


Indien in overleg en onder goedkeuring van de ondernemer minderwerk wordt overeengekomen voor onderdelen welke deel uitmaken van het basis-uitvoeringsniveau van de woning (volgens de technische omschrijving) wordt nadrukkelijk vermeld dat deze onderdelen als geheel buiten de Woningborggarantie vallen. Een en ander conform de Woningborggarantieregeling.

Door de koper aangebrachte wijzigingen op de “keuzelijst meer- en minderwerk” vertegenwoordigen geen enkele rechtsgeldigheid en kunnen daarom helaas niet in behandeling worden genomen.


Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijziging. Over afwijkend meerwerk wordt door Kuin 10% algemene kosten in rekening gebracht.

Voorbeeld keukentekening

BOVENAANZICHT

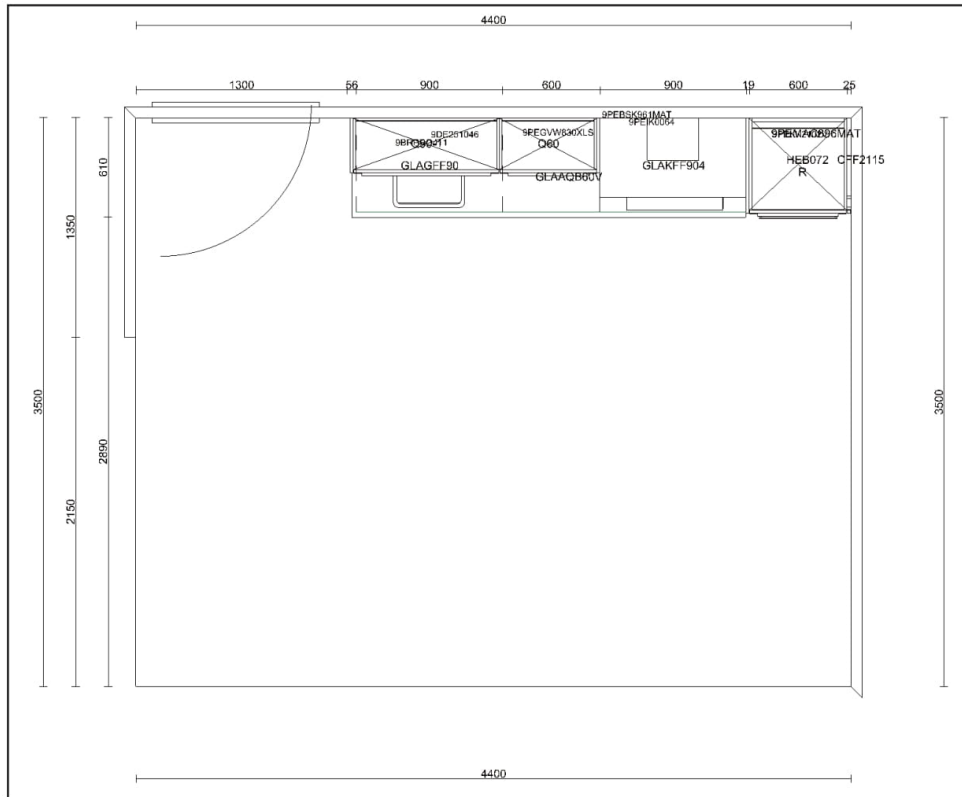


VOORAANZICHT INSTALLATIES

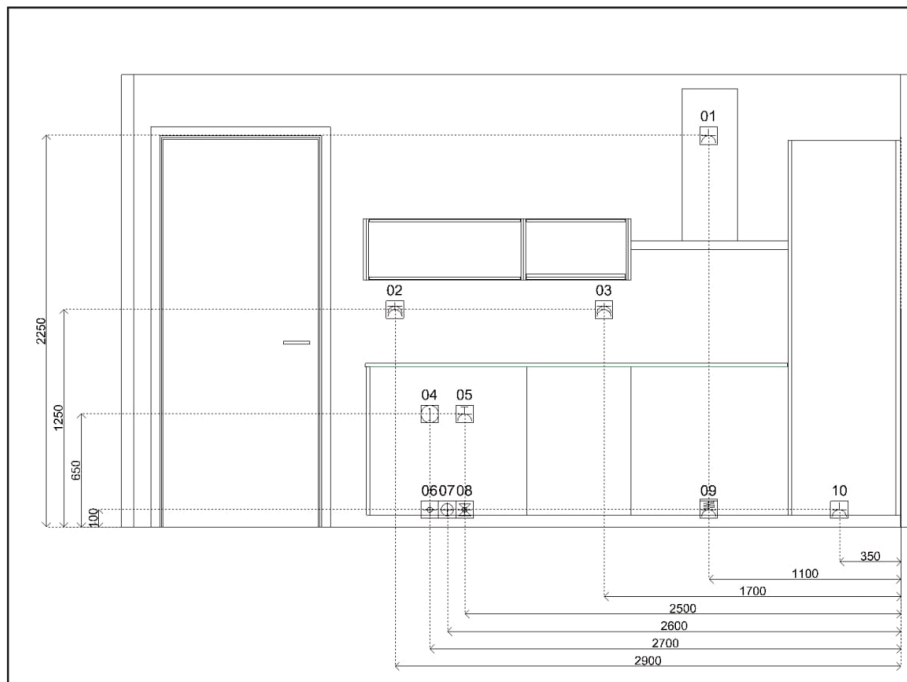

| Sym | Detail |
|-----|---|
| 01 | (S)E-WCD+ra t.b.v.afzuigkap |
| 02 | (S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik |
| 03 | (S)D-WCD+ra t.b.v.huishoudelijk gebruik |
| 04 | (S)Loze leiding tbv boiler |
| 05 | (S)E-WCD+ra (grp) t.b.v.vaatwasser |
| 06 | (S)Warmwaterleiding inclusief filterstopkraan |
| 07 | (S)Afvoer 40mm |
| 08 | (S)Koudwaterleiding inclusief filterstopkraan |
| 09 | (S)2 fasen perilex t.b.v. elektrisch koken |
| 10 | (S)E-WCD+ra t.b.v. koelkast |

Stroomschema kopersproces Kuin

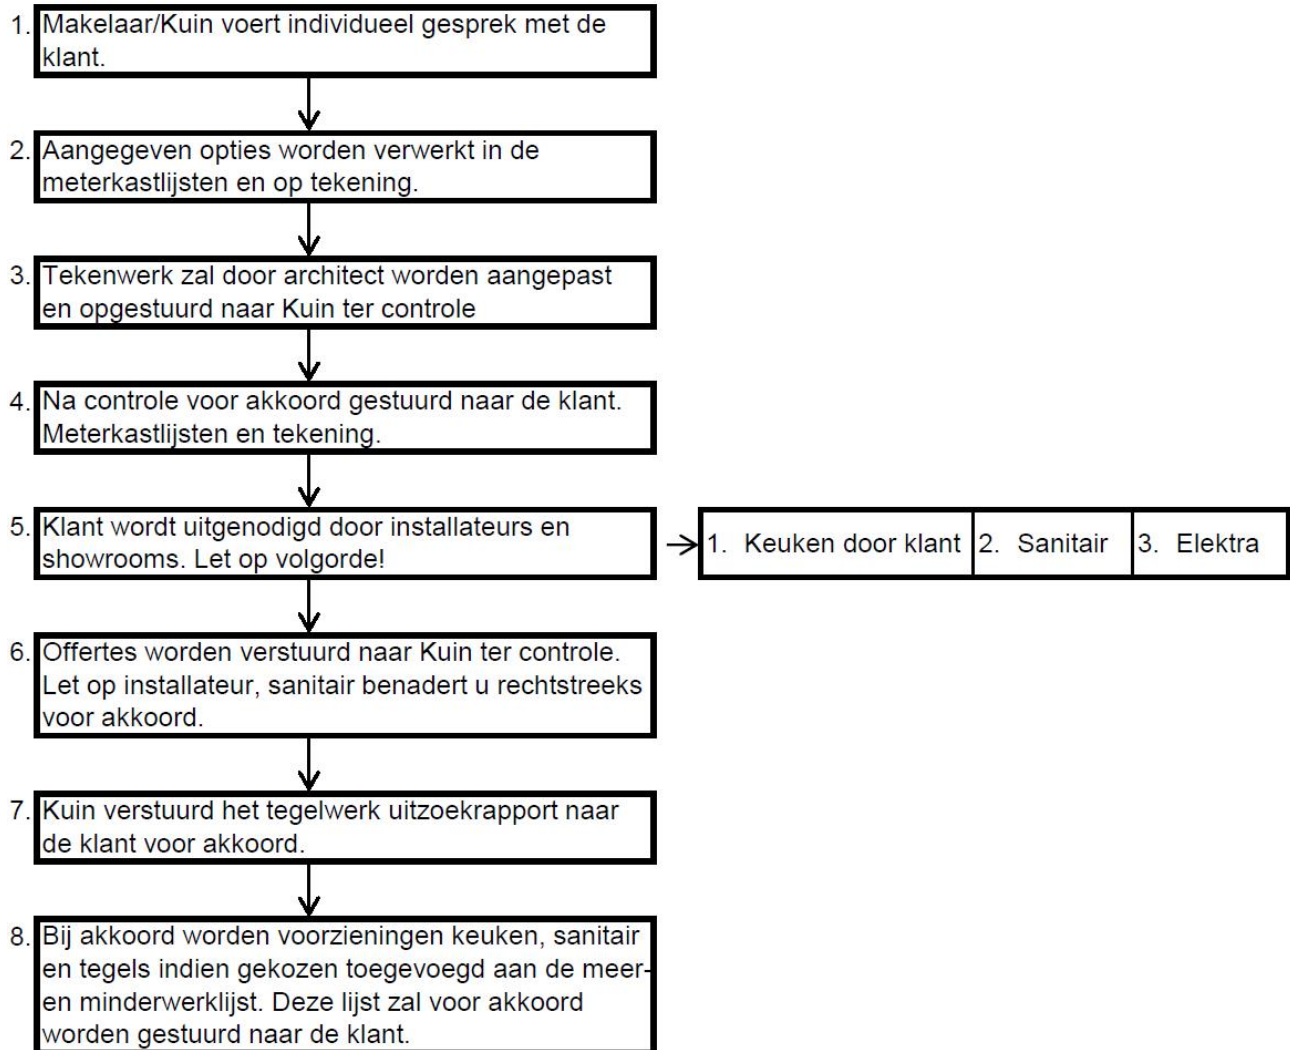

Let op sluitingsdatums, zie overzicht.

1 Ruwbouw

| | | |
|------|---|-------------|
| 101d | Woninguitbreiding 1,1m ¹ aan achterzijde begane grond | € 17.900,00 |
| | <p>Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. De sparing tussen woonkamer/keuken en de tuinkamer wordt hierdoor verbreed. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden.</p> | |
| 112 | Kruipluik in de berging nabij de loopdeur | € 275,00 |
| | <p>Kruipluik plaatsen t.p.v. de loopdeur van de dubbele bergingsdeuren. Kruipruimte onder de berging is niet geventileerd.</p> | |
| 113b | Buitenkraan op zijgevel | € 525,00 |
| | <p>Buitenkraan met slangwartel op de zijgevel van de woning aan de voorkant van de berging (kraan is afsluit-/aftapbaar). Locatie conform tekening.</p> | |
| 115 | Uitstortgootsteen in de berging | € 1.250,00 |
| | <p>Geplaatst in de berging op de scheidingswand met de woning. Inclusief rooster en afsluitbare koudwater kraan. Hierbij adviseren wij i.v.m. bereikbaarheid van de installaties om een kruipluik in de begane grondvloer mee te nemen, zie optie 112.</p> | |
| 118 | Aanbrengen van matglas in het badkamerraam | € 300,00 |
| | <p>Prijs per ruit. Het vervangen van standaard glas door matglas in het badkamerraam. Deze optie is niet mogelijk bij dakvensters.</p> | |
| 121c | Draai-/kiepraam in kozijn | € 600,00 |
| | <p>In plaats van een kozijn met vast glas, een kozijn met een draai-/kiepraam. Alleen mogelijk indien afmeting kozijn dit toe laat.</p> | |
| 125 | Wijzigen draairichting/actieve/passieve deur in gevel | € 100,00 |
| | <p>Het wijzigen van loopdeur/draairichting van de deur in het kozijn. Prijs per stuk.</p> | |
| 129 | Keukenopstelling in de woning verplaatsen | € 1.400,00 |
| | <p>Keukenopstelling verplaatsen naar voorgevel. Ook zullen de aansluitpunten in de woonkamer verplaatst worden. Een en ander conform tekening. Mechanische ventilatie wordt verplaatst naar de lepe hoek van de trap. Leidingwerk t.b.v. de mechanische ventilatie wordt versleept over de trapsparring en wordt omtimmert in een koof.</p> | |

| | | |
|------|--|------------|
| 130b | Trapkast onder verdiepingstrap begane grond | € 1.350,00 |
| | De trap naar de 1e verdieping wordt als dicht uitgevoerd d.m.v. stootborden tussen de treden t.b.v. een trapkast met lichtpunt + schakelaar en gecombineerde enkele wandcontactdoos conform optie plattegrond. | |
| 131 | Inloopkast in slaapkamer | € 950,00 |
| | Een inloopkast conform tekening. Er wordt een wand van gipsblokken geplaatst, een extra dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met schakelaar. | |
| 132 | Slaapkamers samenvoegen | € -600,00 |
| | Het samenvoegen van twee slaapkamers volgens optietekening. Hierbij vervalt een deur met kozijn, lichtpunt, schakelaar en thermostaat. Elektra wijzigt conform optietekening. | |
| 135b | Vergroten dakvenster van ±78x98cm naar ±114x118cm | € 450,00 |
| | Betreft dakvenster met HR+++ glas. Let op: bovenzijde dakvenster kan mogelijk boven de advieshoogte uitkomen. | |
| 155 | Deur naar berging | € 250,00 |
| | Het plaatsen van een standaard kozijn inclusief deur tussen tuinkamer en berging. hierbij komt het standaard muurrooster te vervallen. | |
| 180 | Individuele opties | |
| | Individuele ruwbouw opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 180. | |

2 Keuken

Er wordt door Kuin geen keukenopstelling geplaatst.

Wanneer u bij Eigenhuis keukens (of een andere keukenleverancier) een keukeninrichting heeft uitgezocht, kan de kopersbegeleider een offerte uitbrengen voor het aanpassen van de installatie.

De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie worden dan opgenomen in de meer-/minderwerklijst.

Om een offerte te kunnen maken, zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld voor de gegevensverstrekking waaraan u moet voldoen.

Voorwaarden:

- Plattegrond, bij voorkeur op A4 of A3 formaat, met daarop aangegeven een nummering voor de wandanzichten (bijvoorbeeld wand A, B...).
- Aanzicht tekeningen van alle wanden waar installaties in aangebracht moeten worden.
- Een overzicht van de capaciteiten van bijvoorbeeld een elektrische kookplaat, magnetronaansluiting e.d. Dit kan op de tekening bij de betreffende wandcontactdoos worden aangegeven of op een aparte lijst waarbij de aansluitingen op de tekening worden gecodeerd en deze codering correspondeert met de codering op de lijst.
- Uw keuze elektrisch of keramisch koken (aantal kW van de kookplaat).
- Uw keuze voor een (recirculatie) afzuigkap.
- Installatiewerk t.b.v. een "keukeneiland" wordt niet op hoogte aangeboden maar op de vloer afdopt.
- Ventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet worden gewijzigd.

Op iedere tekening dient het onderstaande te zijn vermeld:

- Projectnaam, bouwnummer en naam koper.
- Datum.
- Duidelijke maatvoering van de keukenruimte en/of de keukenopstelling ten opzichte van de binnenwanden.
- De benodigde installaties (elektra, water, riool) inclusief duidelijke breedte en hoogtemaatvoering ten opzichte van de vloer en de binnenzijde van de wanden in deze ruimte.
- De capaciteit van de aansluiting, dit mag ook op een aparte lijst worden aangegeven. Als een aansluiting op een aparte groep aangesloten moet worden uit praktisch oogpunt, dus niet omdat het technisch is vereist, dient dit aangegeven te worden op tekening.
- Alle standaard installatie-onderdelen, ook indien u er in uw keuken geen gebruik van maakt. (bijv. loze leiding boiler/vaatwasser)

Vergeet niet de posities voor de dubbele wandcontactdozen ten behoeve van het huishoudelijk gebruik boven het aanrecht aan te geven op de installatietekening(en)!!

Zie voor een voorbeeld van een keukentekening zoals deze aangeleverd dient te worden op pagina 5.

200 Het wijzigen van rioolpunten van de standaard keuken

Het wijzigen of aanvullen van rioleringspunten in de begane grond omtrent de installaties van de keuken. Wijzigingen van de keukenaansluitingen dienen vóór aanvang van de bouw aan ondernemer te worden opgedragen, zie sluitingsdata.

280 Individuele opties keuken

Individuele keukenopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 280.

3 Sanitair

T.o.v. het standaard sanitair kunt u afwijkend sanitair uitzoeken via de leverancier van onze installateur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Alleen via deze weg wordt het afwijkend sanitair door onze installateur aangebracht

300 Getekende offerte sanitair

Sanitair offerte d.d.:

303c Vervallen luxe wastafel en spiegel € -350,00

Zelf na oplevering een wastafel(meubel) in de badkamer plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

303d Vervallen luxe fontein € -100,00

Zelf na oplevering een fontein in het toilet plaatsen. Het leidingwerk wordt op de standaard plaatsen afgedopt opgeleverd.

304c Vervallen luxe douchemengkraan € -150,00

Aansluitpunten blijven gehandhaafd.

315a Douchemuur in badkamer 'Luxe' tegelwerk € 725,00

Douchemuur plaatsen in de badkamer ±2,1 meter hoog, ±100 cm breed en ±10 cm dik, inclusief Luxe tegelwerk. Locatie door u op te geven.

315b Douchemuren in badkamer 'Luxe' tegelwerk € 900,00

Twee stuks douchemuren plaatsen in de badkamer 2,1 meter hoog, ±60 cm breed, 10 cm dik, inclusief Luxe tegelwerk. Douchehoek minimaal 1000x1000mm tussen de douchemuren i.v.m. voldoende doorloop. I.c.m. optie douchedrain alleen mogelijk met afschotprofiel. Locatie door u op te geven.

320 Nis in douchewand € 400,00

Het maken van een nis in de douchemuur van 500x300mm incl. het plaatsen van een tegelplaat aan achterzijde van de nis over de gehele muur. Maximaal 1 nis per douchewand. Onderkant nis op ±120cm hoogte naar inzicht van tegelzetter. Alleen mogelijk i.c.m. douchemuur van minimaal 90cm breed.


322b Vervallen luxe tegelwerk en sanitair incl. bad in badkamer € -3.650,00

Het compleet laten vervallen van het luxe wand- en vloertegelwerk en het luxe sanitair in de badkamer (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, douche-installatie, bad, omtimmeringen en dergelijke). De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk. De elektrische voorzieningen en de elektrische radiator zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.

De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.
De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.
Met het vervallen van de tegelvloer, vervalt ook de dekvloer waarop de tegels gelegd zouden worden. De eventuele vloerverwarming wordt aangebracht conform standaard badkamer indeling.
Zie onderstaand de aanvullende opmerkingen A t/m I van de standaard meer en minderwerk lijst

Indien een koper in de showroom van Aannemingsbedrijf Kuin niet tot de gewenste invulling qua tegelwerk kan of wil komen, kan in overleg het sanitair en tegelwerk in de badkamer en / of het toilet komen te vervallen. Het aanbrengen van het sanitair en tegelwerk dient dan na de oplevering door de koper zelf verzorgd te worden. Men dient echter wel rekening te houden met de volgende zaken:

- A) Een deel van de garantie zal vervallen (zie voor toelichting de Woningborg garantie en waarborgregeling).
- B) Ten tijde van de oplevering zal de woning niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen. De koper dient de afbouw van de woning conform de eisen van het bouwbesluit zelf te laten verzorgen.
- C) De mogelijkheid bestaat dat een of meerdere van de nutsbedrijven niet tot levering van water of elektriciteit overgaat, omdat de installaties niet in zijn geheel zijn afgewerkt. In dat geval zal de koper voor zijn rekening en risico na voltooiing zelf een keuringsaanvraag bij de nutsbedrijven moeten indienen, waarbij pas na goedkeuring water of elektriciteit geleverd zal worden.
- D) Er wordt met nadruk op gewezen dat voor de oplevering van de woning geen (voorbereidende) werkzaamheden voor de afbouw door derden uitgevoerd kunnen worden.
- E) De leidingen worden afgedopt op die plaatsen, waar ze binnenkomen. Het aanpassen van leidingen/afvoeren is bij deze keuze dus niet mogelijk. Alvorens werkzaamheden uit te voeren aan de installaties (na de oplevering) en de waterdruk op de installaties (water en c.v.) te zetten, dient u zorgvuldig alle aansluitingen op lekkages te controleren.
- F) Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin garandeert dat door dit installatiebedrijf aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit de door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door het installatiebedrijf aangebrachte leidingwerk niet onder de garantie vallen.
- G) De minderprijs zoals hierboven aangegeven voor het vervallen van bepaalde onderdelen is een lager bedrag dan de verrekenprijs voor het uitzoeken van tegelwerk en sanitair bij leveranciers van B.V. Aannemingsbedrijf J. Th. Kuin Het verschil heeft o.a. te maken met reeds gemaakte voorbereidingstijd, afname verschillen en de daarbij behorende prijsafspraken.
- H) Het beschikbaar stellen van een woning die niet voldoet aan de minimale eisen van het bouwbesluit, is in feite niet toegestaan zonder de goedkeuring van de overheid. Indien de overheid niet akkoord gaat, behoudt B.V. Aannemingsbedrijf J.Th.Kuin zich het recht voor, wijzigingen die leiden tot een woning die niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen, niet uit te voeren.
- I) Bij uitbreiding van de warmwaterinstallatie met meerdere warm watertappunten moet rekening worden gehouden met de tapcapaciteit van de standaard te leveren c.v. / warmwaterinstallatie, of de installatie aangepast moet worden.



| | | |
|------|--|-----------|
| 322c | Vervallen luxe tegelwerk en sanitair toilet begane grond | € -750,00 |
| | <p>Het compleet laten vervallen van het luxe wand- en vloertegelwerk en het luxe sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, omtimmeringen en dergelijke).</p> <p>De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.</p> <p>Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.</p> <p>De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.</p> <p>De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.</p> <p>De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.</p> <p>Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.</p> <p>Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.</p> | |
| 322d | Vervallen luxe tegelwerk en sanitair toilet 1e verdieping | € -750,00 |
| | <p>Het compleet laten vervallen van het luxe wand- en vloertegelwerk en het luxe sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoirs, kranen, omtimmeringen en dergelijke).</p> <p>De wanden worden onafgewerkt opgeleverd.</p> <p>Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.</p> <p>De elektrische voorzieningen zijn voor zover mogelijk op de onafgewerkte wand gemonteerd.</p> <p>De water- en rioolleidingen worden afgedopt waar ze binnen komen.</p> <p>De leidingkoker en toiletwand van gipsblokken of hout worden niet geplaatst.</p> <p>Dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.</p> <p>Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.</p> | |
| 322e | Vervallen luxe vloertegelwerk in toiletruimte | € -70,00 |
| | <p>Prijs per stuk.</p> <p>Het compleet laten vervallen van het luxe vloertegelwerk in het toilet.</p> <p>De onderzijde van het wandtegelwerk wordt niet gekit.</p> <p>Inclusief het vervallen van de dorpel tussen het kozijn.</p> <p>De dekvloer in toiletruimte blijft gehandhaafd.</p> <p>Tevens zijn aanvullende opmerkingen A t/m I van toepassing zoals weergegeven onder optie 'vervallen van tegelwerk en sanitair in badkamer'.</p> <p>Deze optie kan niet i.c.m. optie 322c en 322d.</p> | |
| 380 | Individuele opties sanitair | |
| | <p>Individuele sanitair opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 380.</p> | |

4 Elektrische installatie

U heeft de mogelijkheid om een afspraak te maken met de elektriciens om uw aanvullende wensen kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buitenspotjes, wcd's met usb, trekschakelaar nabij bed etc. Aannemingsbedrijf Kuin zal in samenwerking met de elektriciens een offerte aanbieden.

400 Getekende offerte elektrische installatie

Elektra offerte d.d.:

| | | |
|-----|--------------------------------|----------|
| 401 | Loze leiding t.b.v. CAI / DATA | € 160,00 |
|-----|--------------------------------|----------|

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

| | | |
|-----|-----------------------------------|----------|
| 402 | Bedraden van loze leiding met CAI | € 160,00 |
|-----|-----------------------------------|----------|

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

| | | |
|-----|------------------------------------|----------|
| 403 | Bedraden van loze leiding met DATA | € 160,00 |
|-----|------------------------------------|----------|

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

| | | |
|-----|-------------------------------|----------|
| 404 | Extra dubbele wandcontactdoos | € 200,00 |
|-----|-------------------------------|----------|

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

| | | |
|-----|--|----------|
| 405 | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep | € 270,00 |
|-----|--|----------|

Locatie(s) aan te geven door bewoner. Prijs per stuk.

| | | |
|-----|---|----------|
| 410 | Geschakelde grondkabel t.b.v. tuinverlichting | € 440,00 |
|-----|---|----------|


Het aanbrengen van 10 meter (opgerolde) grondkabel op een aparte groep t.p.v. achtergevel. Geschakeld middels schakelaar nabij achterdeur t.b.v. toekomstig tuinverlichting.

| | | |
|-----|--|----------|
| 411 | Voorziening t.b.v. toekomstige elektrische zonwering | € 275,00 |
|-----|--|----------|

Er wordt een inbouwdoos met voeding geplaatst nabij het betreffende kozijn met loze leiding tot buiten de gevel. Met deze voorziening kan op later tijdstip een elektrisch bedienbare zonwering worden aangesloten. Prijs is exclusief schakelaar, deze dient u later aan te brengen.

| | | |
|------|---|----------|
| 412a | Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar | € 200,00 |
|------|---|----------|

| | | |
|------|--|----------|
| 412b | Extra buitenlichtpunt op aparte schakelaar | € 275,00 |
|------|--|----------|



| | | |
|------|--|----------------------|
| 413 | Geschakelde spatwaterdichte buitenwandcontactdoos | € 280,00 |
| | Een spatwaterdichte wandcontactdoos geplaatst op de achtergevel naast de pui op ca. 40 cm boven maaiveld/terras. | |
| 415 | Wisselschakelaar in de berging | € 150,00 |
| 416 | Verplaatsen van wandcontactdozen of loze leidingen | € 60,00 |
| | Prijs per stuk. | |
| 420a | PV-panelen op kapschuimte | Prijs op aanvraag |
| | Het plaatsen of uitbreiden van zwarte pv-panelen op de kapschuimte van de woning. De panelen worden op de pannen aangebracht. Locatie(s) nader te bepalen. | |
| 480 | Individuele opties elektra | |
| | Individuele elektra opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 480. | |

5 CV-installatie

In overleg met de verwarmingsinstallateur kunnen een aantal wijzigingen worden aangebracht in de standaard c.v.-installatie.

501 Vloerverwarming aanpassen n.a.v. keukenopstelling € 125,00

Het aanpassen van de vloerverwarming naar aanleiding van een gewijzigde keukenopstelling. De gehele keukenopstelling zal gespaard worden van vloerverwarming.

503d Elektrische decorradiator badkamer kleur antraciet € 200,00

Elektrische decorradiator $\pm 600 \times 1800$ mm (± 1200 watt) kleur antraciet met een chromekleurige thermostaat aan onderzijde. De elektrische decorradiator in kleur wit komt hierbij te vervallen.

508c Elektrische radiator als bijverwarming € 750,00

Het plaatsen van een elektrische radiator van ± 1500 Watt als bijverwarming.

580 Individuele opties CV

Individuele CV-opties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 580.

6 Tegelwerk

In de showroom kunt u tegelwerk uitzoeken voor de badkamer en het toilet. U dient een keuze te maken uit ons aangeboden assortiment, indien u graag ander tegelwerk wilt dan dient u te kiezen voor optie 321 (compleet laten vervallen van het tegelwerk en sanitair) met de daarbij vermelde consequenties.

| | | |
|------|---|------------|
| 601c | Wandtegels Luxe in badkamer | € 0,00 |
| | Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden. | |
| 601d | Wandtegels Exclusief in badkamer | € 850,00 |
| | Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie wandtegels Luxe in badkamer. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete badkamer. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden. | |
| 602b | Vloertegels Luxe in badkamer | € 0,00 |
| | Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix. | |
| 602c | Vloertegels Exclusief in badkamer | € 800,00 |
| | Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51. | |
| 602d | Vloertegels Houtlook in badkamer | € 1.050,00 |
| | Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. Houtlook tegels zijn alleen mogelijk i.c.m. een draingoot. De tegels worden in de lengterichting evenwijdig aan de draingoot aangebracht. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. | |
| 604a | RVS-Aquakeil tot 1m ¹ | € 0,00 |
| | Benodigd voor afschot bij een draingoot. | |
| 604b | RVS-Aquakeil tot 1,5m ¹ | € 50,00 |
| | Benodigd voor afschot bij een draingoot. | |
| 604c | Antraciet douchedorpel 50x20mm tot 1,2m ¹ | € 0,00 |
| | Benodigd voor afschot bij een draingoot. | |

| | | |
|------|---|----------|
| 605c | Douchemuur uitvoeren in 'Exclusief' tegelwerk | € 125,00 |
| | De douchemuur conform optie 315 wijzigen naar 'Exclusief' tegelwerk. Alleen mogelijk i.c.m. optie 315. | |
| 611c | Wandtegels Luxe in toiletruimte | € 0,00 |
| | Luxe wandtegelwerk paneel 15 t/m 22. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden. | |
| 611d | Wandtegels Exclusief in toiletruimte | € 200,00 |
| | Exclusief wandtegelwerk paneel 41 en 46 t/m 56. De tentoongestelde wandtegels Procasa Essentials 30x60cm in de kleur wit behoren tot de optie 'Wandtegels Luxe in badkamer'. Bij wandtegels Luxe in combinatie met wandtegels Exclusief wordt de prijs gehanteerd van wandtegels Exclusief voor de complete toiletruimte. Bij de keuze uit twee verschillende soorten ±20/30x60cm wandtegels kunnen deze niet horizontaal strokend verwerkt worden. | |
| 612c | Wandtegels Luxe in toiletruimte tot plafond | € 550,00 |
| | Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Luxe. | |
| 612d | Wandtegels Exclusief in toiletruimte tot plafond | € 800,00 |
| | Wandtegelwerk tot aan plafond. Complete toiletruimte uitvoeren in Exclusief. | |
| 613b | Vloertegels Luxe in toiletruimte | € 0,00 |
| | Vloertegelwerk Luxe lade 1 t/m 12 en paneel 23 t/m 40 behoudens de strokenmix. | |
| 613c | Vloertegels Exclusief in toiletruimte | € 175,00 |
| | Vloertegels Exclusief paneel 41 t/m 51. | |
| 613d | Vloertegels Houtlook in toiletruimte | € 250,00 |
| | Vloertegels Houtlook paneel 52 t/m 58. De vloertegels worden aangebracht naar inzicht van de tegelzetter. Vloertegels Houtlook worden alleen aangebracht in wildverband. Houtlook tegels in de showroom van aannemingsbedrijf Kuin geven een gedeelte weer van de houtlook-print, deze print kan per levering afwijken. De legvolgorde van de houtlook tegels wordt bepaald door de tegelzetter, hier kunnen geen rechten aan worden ontleent. | |

614c Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe € 350,00

Een accentwand van Luxe strokentangels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.

614d Accentwand Luxe strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief € 300,00

Een accentwand van Luxe strokentangels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.

615c Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Luxe € 400,00

Een accentwand van Exclusief strokentangels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.

615d Accentwand Exclusief strokenmix i.c.m. tegelwerk Exclusief € 350,00

Een accentwand van Exclusief strokentangels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel, (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij strokentangels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen, tevens is er bij strokentangels kans op schotelen van de tegels.

616c Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe € 300,00

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

616d Accentwand Luxe vloertegels i.c.m. tegelwerk Exclusief € 125,00

Een accentwand van Luxe vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).


617c Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m. tegelwerk Luxe € 350,00

Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).

| | | |
|---|--|----------|
| 617d | Accentwand Exclusief vloertegels i.c.m tegelwerk Exclusief | € 300,00 |
| <p>Een accentwand van Exclusief vloertegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren).</p> | | |
| 618c | Accentwand Exclusief decortegels i.c.m. tegelwerk Luxe | € 500,00 |
| <p>Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Luxe wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.</p> | | |
| 618d | Accentwand Exclusief decortegels i.c.m tegelwerk Exclusief | € 450,00 |
| <p>Een accentwand van Exclusief decortegels in combinatie met Exclusief wandtegelwerk. Prijs per 3m² incl. RVS haaks afwerkingsprofiel (op tekening de accentwand markeren). Let op! bij decortegels kan i.c.m. strijklicht mogelijk schaduw werking voorkomen. Tevens is er bij decortegels kans op schotelen van de tegels en kunnen er doordat het gebaseerd is op een ambachtelijk productiemethode diverse variaties in kleur en uitvoering ontstaan.</p> | | |


7 Afbouw

| | | |
|------|---|------------|
| 701a | Traptreden uitvoeren in hardhout wit gegrond | € 1.100,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. | |
| 701b | Traptreden uitvoeren in 'Nextstep' met Kleurnummer:..... | € 1.950,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. Schilderwerk trap volgens "Stappenplan Nextstep" door kopers zelf na oplevering. | |
| 701c | Traptreden uitvoeren in Essen Pure | € 2.700,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701d | Traptreden uitvoeren in Essen White | € 2.700,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701e | Traptreden uitvoeren in Essen Ash Gray | € 2.700,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701f | Traptreden uitvoeren in Essen Mud Light | € 2.700,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden af te lakken. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701g | Traptreden uitvoeren in Eiken Pure | € 3.200,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701h | Traptreden uitvoeren in Eiken White | € 3.200,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |




| | | |
|------|---|------------|
| 701i | Traptreden uitvoeren in Eiken Ash Gray | € 3.200,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 701j | Traptreden uitvoeren in Eiken Mud Light | € 3.200,00 |
| | Prijs per trap, exclusief stootborden en slijtstrip. De koper dient na oplevering zelf de treden te nabehandelen. Deze traptreden zijn meer kras- en vlekgevoelig, bij oplevering kunnen er kleine krasjes en vlekken zichtbaar zijn. | |
| 702 | Gehele trap uitvoeren in hardhout wit gegrond | € 2.250,00 |
| | Gehele standaard vuren houten trap inclusief traphek en leuning uitvoeren in hardhout wit gegrond. Exclusief aflak, slijtstrip en eventuele stootborden. Prijs per trap. | |
| 703a | Standaard open vuren trap dicht uitvoeren | € 350,00 |
| | Prijs per trap, hierbij worden wit gegronde stootborden toegepast. | |
| 703e | Treden voorzien van een enkele slijtstrip zwart | € 150,00 |
| | Prijs per trap, slijtstrippen worden los geleverd. Niet mogelijk i.c.m. optie 701b. | |
| 703i | Stootborden wijzigen naar Nextstep als kleur Nextstep treden | € 850,00 |
| | Prijs per trap. | |
| 704a | Model A balusters in hekwerken | € 150,00 |
| | Prijs per trap. Model A, kantige baluster 19x45mm in hekwerken, wit gegrond. | |
| 704b | Model B balusters in hekwerken | € 550,00 |
| | Prijs per trap. Model B, kantige baluster 19x45mm met facet in hekwerken, wit gegrond. | |
| 704c | Model C balusters in hekwerken | € 300,00 |
| | Prijs per trap. Model C, kantige baluster 19x45mm met groef in hekwerken, wit gegrond. | |
| 704d | Model D balusters in hekwerken | € 400,00 |
| | Prijs per trap. Model D, Zwart stalen sierbaluster. | |

| | | |
|-------|--|-----------|
| 704e | Model E balusters in hekwerken Prijs per trap. Model E, Zwart stalen ronde baluster | € 400,00 |
| 705a | Model A leuningen Prijs per trap. Model A, kantig 38x80mm exclusief aanpassing dekregels van de vloerhekken. Afwerking wit gegrond. | € 200,00 |
| 705b | Model B leuningen en dekregels Prijs per trap. Model B, kantig met groef 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a. | € 850,00 |
| 705c | Model C leuningen en dekregels Prijs per trap. Model C, sleutelgatprofiel 38x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. | € 600,00 |
| 705d | Model D leuningen en dekregels Prijs per trap. Model D, sleutelgatprofiel 50x80mm. De gekozen leuning / dekregel wordt niet toegepast op de dichte paneelhekwerken. Afwerking wit gegrond. Alleen mogelijk in combinatie met optie 706a. | € 850,00 |
| 706a1 | Trapspillen wijzigen naar 90x90mm Prijs per woning (2 stuks trappen). | € 700,00 |
| 706c | Trapspillen met diamantkop en groeven Prijs per woning. Alleen mogelijk i.c.m. optie 706a. | € 900,00 |
| 712a | Vervallen spuitwerk begane grond Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping. Inclusief het vervallen van het plafondspuitwerk in de tuinkamer/berging. | € -200,00 |
| 712b | Vervallen spuitwerk plafond begane grond incl. uitbouw Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping. Inclusief het vervallen van het plafondspuitwerk in de tuinkamer/berging. | € -240,00 |



| | | |
|------|---|-----------|
| 712c | Vervallen spuitwerk plafond 1e verdieping | € -200,00 |
| | Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het plafond en tevens het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk indien van toepassing op de betreffende verdieping. | |
| 712e | Vervallen spuitwerk op wand toilet begane grond | € 0,00 |
| | Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de begane grond. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt. | |
| 712f | Vervallen spuitwerk op wand toilet 1e verdieping | € 0,00 |
| | Het vervallen van het spuitwerk incl. reparaties en voorbehandeling van het spuitwerk op de wanden boven het tegelwerk in het toilet op de 1e verdieping. Bovenzijde wandtegel blijft onafgewerkt. | |
| 715 | Luxe RVS hang- en sluitwerk | |
| | Luxe RVS rond schild zit standaard in de prijs, bemonstering op kantoor Kuin. | |
| 719 | Opdekdeuren in hardhoutenkozijn wijzigen naar stomp | € 100,00 |
| | Het wijzigen van de standaard opdekdeuren in hardhouten kozijn naar stompe deuren. Let op, deuren zijn ook niet afgeschilderd. Stompe binnendeurkozijnen waarbij de deur niet verder open kan dan 150 graden voldoen niet aan de eisen t.b.v. de vrije doorgang conform bouwbesluit. Prijs per deur/kozijn. Uitsluitend per verdieping. | |
| 720 | Standaard binnendeur vervallen | € -50,00 |
| | Prijs per stuk. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast i.v.m. eisen bouwbesluit. | |
| 721b | Vervallen standaard hardhouten kozijn met opdekdeur | € -150,00 |
| | Prijs per stuk. Sparing in gipswand van ±925mm tot plafond. Woning voldoet niet meer aan de geluidseisen conform bouwbesluit. Niet mogelijk bij deur meterkast, toilet en badkamer. Kopse kanten van de sparing zijn onafgewerkt. | |
| 725 | Standaard binnendeur verplaatsen excl. schakelaar | € 50,00 |
| | Exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs per stuk. | |



| | | |
|------|---|----------------------|
| 726 | Luxe deuren i.p.v. standaard | Prijs op aanvraag |
| | Volgens monsters in de showroom Kuin. Graag het volgende omschrijven; Aantal: Locatie: Type deur: Stomp / Opdek Type Glas: | |
| 727 | Wijzigen draairichting binnendeur | € 50,00 |
| | Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur exclusief het wijzigen van elektra (zelf opnemen met de Installateur). Prijs per stuk. | |
| 730a | Standaard vensterbank uitvoering Bianco C | € 0,00 |
| 730b | Wijzigen vensterbank uitvoering naar Hardsteen MI | € 400,00 |
| | Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning. | |
| 730e | Wijzigen vensterbank uitvoering naar Polare MI | € 350,00 |
| | Alleen mogelijk in gehele woning. | |
| 730f | Wijzigen vensterbank uitvoering naar Bianco MI | € 350,00 |
| | Alleen mogelijk in gehele woning. | |
| 730g | Wijzigen vensterbank uitvoering naar Titano MI | € 350,00 |
| | Alleen mogelijk voor gehele woning. | |
| 730h | Wijzigen vensterbank uitvoering naar Grigio MI | € 400,00 |
| | Donkere kleur vensterbank is meer krasgevoelig dan een lichte kleur, bij oplevering kunnen kleine krasjes zichtbaar zijn. Alleen mogelijk in gehele woning. | |
| 780 | Individuele opties afbouw | |
| | Individuele Ruwbouwopties worden op de meterkastlijst vermeld vanaf volgnummer 780. | |
